# Заявка ASIQPAI: письмо и план

Oct 14, 2026 · @Adil

## Сопроводительное письмо

**Кому:** ASIQPAI, Колмакову Евгению Олеговичу **Тема:** Заявка на задачу «Разработка UX/UI-дизайна Telegram Mini App ASIQPAI» (Astana Hub, приём решений до 22.10.2026)

Евгений Олегович, здравствуйте.

Направляю заявку на разработку UX/UI-дизайна ASIQPAI. Вместо описания подхода прилагаю готовый результат: за неделю после публикации ТЗ собран рабочий дизайн-пакет v1.0, который закрывает этапы 2, 3, 4 и 6 календарного плана и даёт материал для этапов 1 и 5.

В пакете: UX-аудит с приоритетами, информационная архитектура и семь пользовательских сценариев, дизайн-система «тёмная студия, золотой сигнал» с UI Kit на 98 иконок и 73 токена, кликабельный прототип на 36 экранов и 18 шитов со всеми состояниями из п. 3.2.1, handoff-спецификация под ваш стек HTML/CSS/JS и план проверки на пяти пользователях. Прототип открывается по ссылке на любом телефоне, проверен на 320 px, в Telegram Desktop, при крупном тексте и с казахскими строками.

Что это значит для вас: два месяца по ТЗ уходят не на поиск концепции, а на её проверку с реальным MVP и реальными артистами. Этап 1 начинается с аудита живого продукта по готовому чек-листу, этап 5 проводится по готовому протоколу, Figma-библиотека собирается из уже согласованных токенов. Риск «не угадали со стилем» снимается до подписания договора: вы видите результат сейчас.

Основные решения, которые предлагаю обсудить на старте: центральная кнопка «Студия» в таб-баре, линейный сценарий записи в четыре шага (бит, запись, обработка, экспорт), стоимость AI-операции на кнопке и списание кредитов только после успешного результата, фиксированная тёмная тема с золотом независимо от темы Telegram.

Готов провести демонстрацию прототипа в течение 30 минут в удобное время и передать доступ к пакету до выбора исполнителя.

С уважением, Майданов Адиль Кокенович, физическое лицо (договор ГПХ). Telegram: @kokenovich. Проект автора: mnogonotka.com

Стоимость работ: 1 200 000 ₸ за весь объём по ТЗ, оплата поэтапная после приёмки.

## Что уже сделано

Пакет v1.0 от 14.10.2026 покрывает семь позиций п. 5.2 ТЗ; не сделано только то, что требует доступа от заказчика (MVP, Figma, участники теста).


| П. 5.2 ТЗ | Артефакт | Состояние | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | Figma-файл | Импорт в Figma заказчика на этапе 3 | Источник: HTML-экраны + tokens.json |
| 2 | UI Kit / дизайн-система | Готово, v1 | 73 токена, 98 иконок, 40+ компонентов со состояниями |
| 3 | User flow / IA | Готово | Карта разделов, 7 сценариев, матрица экраны × 6 состояний, 5 диаграмм |
| 4 | Кликабельный прототип | Готово | 36 экранов, 18 шитов, 7 сквозных сценариев, режимы 320 px / 390 px / Desktop |
| 5 | Ассеты | Готово | SVG-иконки, логотип, tokens.json; PNG/WebP по запросу |
| 6 | Руководство по стилям | Готово | Живая галерея UI Kit с правилами и контрастом WCAG |
| 7 | Handoff-спецификация | Готово | 12 разделов: токены, Telegram SDK, аудио, i18n, чек-лист приёмки |
| — | UX-аудит (этап 1) | Экспертная часть готова | 18 находок P0–P2, чек-лист из 22 пунктов для живого MVP |

| П. 5.2 ТЗ | Артефакт | Состояние | Объём |
|---|---|---|---|
| — | План пользовательской проверки (этап 5) | Готово | Скринер, 8 задач, SEQ/SUS, протокол, расписание |

Пакет открывается по ссылке claude.ai/artifact/KjM84mjs4WktWxN4Tu8CrZ (доступ выдаётся заказчику по запросу); исходники в репозитории github.com/adilmaidanov94/asiqpai-design (публичный; онлайн-версия пакета и прототипа на adilmaidanov94.github.io/asiqpai-design).

## Календарный план

Срок по ТЗ сохраняется: 2 календарных месяца (8 недель) от даты старта, шесть этапов с поэтапной приёмкой. Этапы 3 и 4 идут внахлёст, как заложено в ТЗ (0.5 + 0.75 мес. внутри первых шести недель).

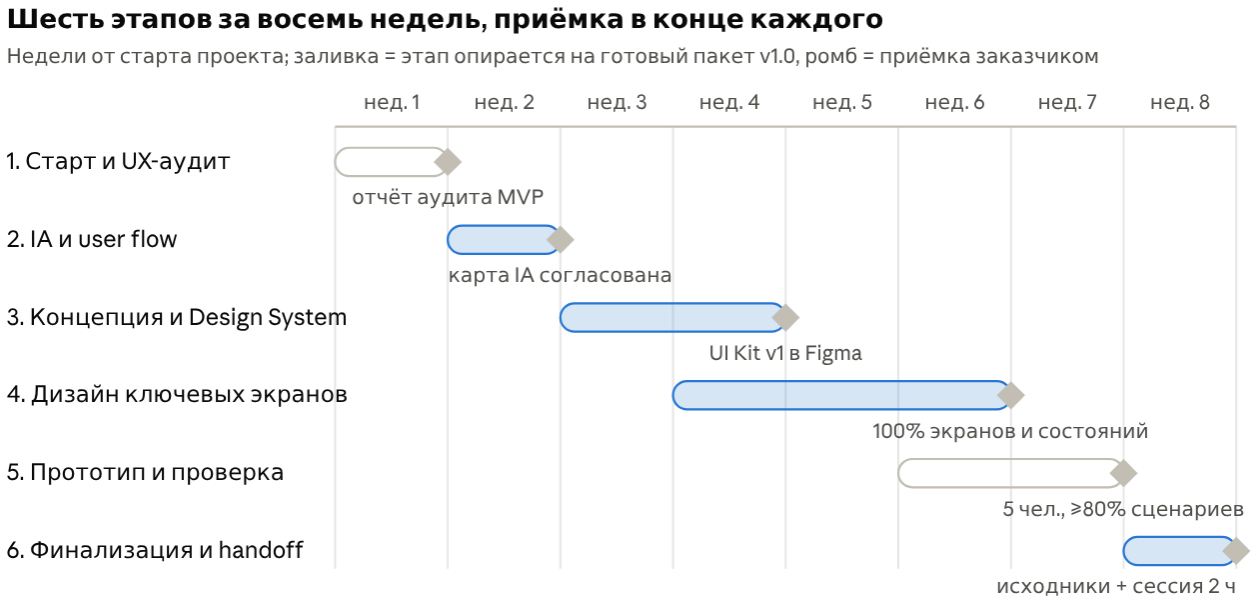


календарный план · 6 этапов, 8 недель

Этапы 2, 3, 4 и 6 опираются на готовый пакет v1.0, поэтому их время уходит на согласование и перенос в Figma, а не на разработку с нуля; этапы 1 и 5 требуют доступа к MVP и участников теста.

| Этап | Недели | Содержание работ | Результат | Критерий приёмки |
|---|---|---|---|---|
| 1. Старт и UX-аудит | 1 | Интервью с заказчиком, аудит живого MVP по чек-листу из 22 пунктов, верификация 18 находок v1.0, фиксация приоритетов и ограничений | Отчёт UX-аудита, перечень экранов и сценариев | Перечень согласован; нет незафиксированных критичных требований |
| 2. IA и user flow | 2 | Корректировка карты разделов и 7 сценариев по итогам аудита, согласование навигационной модели | Карта IA и user flow v1.1 | Все сценарии связаны, нет тупиков, структура утверждена |
| 3. Концепция и Design System | 3–4 | Утверждение палитры и типографики, импорт токенов и компонентов в Figma заказчика (Tokens Studio, html.to.design), варианты компонентов | Visual concept, UI Kit v1 в Figma | Концепция согласована; базовые компоненты как переиспользуемые варианты |
| 4. Дизайн ключевых экранов | 4–6 | Перенос 36 экранов в Figma, доработка по аудиту, состояния loading / empty / error / success / disabled / confirm | Полный набор макетов | 100% согласованных экранов; состояния предусмотрены |
| 5. Прототип и проверка | 6–7 | Обновление прототипа, рекрут 6 участников, 5 модерируемых сессий по протоколу, триаж P0–P2, правки, ре-тест | Прототип v1.1, отчёт тестирования | ≥80% ключевых сценариев без критической помощи; P0 устранены |

| Этап | Недели | Содержание работ | Результат | Критерий приёмки |
|---|---|---|---|---|
| 6. Финализация и handoff | 8 | Финальный UI Kit, ассеты SVG/PNG/WebP, обновлённая handoff-спецификация, передача Figma-исходников, сессия до 2 ч | Figma source, UI Kit, ассеты, спецификация | Исходники у заказчика; компоненты именованы; замечания закрыты |

## Оплата и что нужно от заказчика

Оплата поэтапная после акта приёмки каждого этапа (п. 4.5.1 ТЗ); аванс не требуется, так как большая часть работы уже предъявлена. Доли пропорциональны трудоёмкости этапов в ТЗ.

| Этап | Доля | Сумма, ₸ | Основание для оплаты |
|---|---|---|---|
| 1. Старт и UX-аудит | 10% | 120 000 | Акт по отчёту аудита |
| 2. IA и user flow | 10% | 120 000 | Акт по карте IA |
| 3. Концепция и Design System | 20% | 240 000 | Акт по UI Kit v1 в Figma |
| 4. Дизайн ключевых экранов | 30% | 360 000 | Акт по набору макетов |
| 5. Прототип и проверка | 20% | 240 000 | Акт по отчёту тестирования |
| 6. Финализация и handoff | 10% | 120 000 | Финальный акт, передача исходников |
| Итого | 100% | 1 200 000 | Фиксированная стоимость по договору |

Итоговая стоимость: 1 200 000 ₸, без аванса, фиксируется договором. Гарантийный период на исправление несоответствий ТЗ: 30 календарных дней после финальной приёмки (п. 6.2 ТЗ).

Для старта нужно от заказчика (п. 5.1 ТЗ):

- [ ] Доступ к актуальному MVP (тестовый аккаунт с кредитами) к неделе 1
- [ ] Бренд-материалы и решение по палитре (база: тёмная + золото) к неделе 2

- [ ] Рабочее пространство Figma с правами редактора к неделе 3
- [ ] Контакт разработчика MVP для вопросов по стеку и ограничениям
- [ ] 5–6 пользователей из базы ASIQPAI для теста к неделе 6 (или согласие на внешний рекрут)
- [ ] Обратная связь по каждому этапу в течение 3 рабочих дней после сдачи

## Квалификация и приложения

Заполняется по форме листа «Квалификационные требования» ТЗ; пороги ТЗ указаны для сверки.

| Поле ТЗ | Требование ТЗ | Ответ |
|---|---|---|
| Должность, роль | UX/UI / Product Designer, ведущий | Майданов Адиль Кокенович, ведущий UX/UI-дизайнер проекта |
| Образование | Желательно профильное; допускается портфолио | Квалификация подтверждается портфолио и действующим продуктом (допускается ТЗ) |
| Общий / профильный стаж | от 2 лет / от 2 лет в мобильных или web | 10 лет / 10 лет |
| Аналогичные проекты | не менее 2; желательно music-tech, AI, Telegram Mini Apps | 1) ASIQPAI дизайн-пакет v1.0, 2026, ведущий дизайнер (приложено); 2) mnogonotka.com, музыкальная веб-платформа (нотные материалы, караоке, тренажёры для хора), собственный продукт, автор и дизайнер |
| Сертификаты | не обязательны | Нет |
| Занятость | не менее 50% | 50% на 8 недель, на неделях 4–7 до 80% |
| Основание | штат / ГПХ / ИП / ТОО | Физическое лицо, договор ГПХ |

| Поле ТЗ | Требование ТЗ | Ответ |
|---|---|---|
| Количество людей | не менее 1 | 1 ведущий дизайнер; на этапе 5 привлекается UX-исследователь-модератор |
| Материально-техническая база | Figma, прототипирование, iOS/Android, Telegram | Figma Professional, iPhone и Android для проверки в Telegram, Telegram Desktop |
| Лицензионная чистота | п. 3.1.4, 3.1.10, 6.1.1 | Шрифты Unbounded, Onest, JetBrains Mono по SIL OFL; иконки собственные; демо-данные вымышленные |

Приложения к заявке:

1. Пакет v1.0: claude.ai/artifact/KjM84mjs4WktWxN4Tu8CrZ; исходники: github.com/adilmaidanov94/asiqpai-design.
2. Прототип онлайн, открывается на телефоне без установки: adilmaidanov94.github.io/asiqpai-design/design/prototype.html; весь пакет: adilmaidanov94.github.io/asiqpai-design.
3. Портфолио: mnogonotka.com, действующий музыкальный веб-продукт автора.
4. Календарный план и порядок оплаты (разделы выше).

Контакт для связи: Майданов Адиль Кокенович, Telegram @kokenovich.
