Заявка ASIQPAI: письмо и план

Oct 14, 2026 · @Adil

Сопроводительное письмо

Кому: ASIQPAI, Колмакову Евгению Олеговичу **Тема:** Заявка на задачу «Разработка UX/UI-дизайна Telegram Mini App ASIQPAI» (Astana Hub, приём решений до 22.10.2026)

Евгений Олегович, здравствуйте.

Направляю заявку на разработку UX/UI-дизайна ASIQPAI. Вместо описания подхода прилагаю готовый результат: за неделю после публикации ТЗ собран рабочий дизайн-пакет v1.0, который закрывает этапы 2, 3, 4 и 6 календарного плана и даёт материал для этапов 1 и 5.

В пакете: UX-аудит с приоритетами, информационная архитектура и семь пользовательских сценариев, дизайн-система «тёмная студия, золотой сигнал» с UI Kit на 98 иконок и 73 токена, кликабельный прототип на 36 экранов и 18 шитов со всеми состояниями из п. 3.2.1, handoff-спецификация под ваш стек HTML/CSS/JS и план проверки на пяти пользователях. Прототип открывается по ссылке на любом телефоне, проверен на 320 px, в Telegram Desktop, при крупном тексте и с казахскими строками.

Что это значит для вас: два месяца по ТЗ уходят не на поиск концепции, а на её проверку с реальным MVP и реальными артистами. Этап 1 начинается с аудита живого продукта по готовому чек-листу, этап 5 проводится по готовому протоколу, Figma-библиотека собирается из уже согласованных токенов. Риск «не угадали со стилем» снимается до подписания договора: вы видите результат сейчас.

Основные решения, которые предлагаю обсудить на старте: центральная кнопка «Студия» в таб-баре, линейный сценарий записи в четыре шага (бит, запись, обработка, экспорт), стоимость AI-операции на кнопке и списание кредитов только после успешного результата, фиксированная тёмная тема с золотом независимо от темы Telegram.

Готов провести демонстрацию прототипа в течение 30 минут в удобное время и передать доступ к пакету до выбора исполнителя.

С уважением, [ФИО], [ИП / ТОО], [телефон], [email], [Telegram]

- [ ] Заполнить реквизиты подписи и ссылку на портфолио перед отправкой

Что уже сделано


Пакет v1.0 от 14.10.2026 покрывает семь позиций п. 5.2 ТЗ; не сделано только то, что требует доступа от заказчика (MVP, Figma, участники теста).

П. 5.2 ТЗ	Артефакт	Состояние	Объём
1	Figma-файл	Импорт в Figma заказчика на этапе 3	Источник: HTML-экраны + tokens.json
2	UI Kit / дизайн-система	Готово, v1	73 токена, 98 иконок, 40+ компонентов со состояниями
3	User flow / IA	Готово	Карта разделов, 7 сценариев, матрица экраны × 6 состояний, 5 диаграмм
4	Кликабельный прототип	Готово	36 экранов, 18 шитов, 7 сквозных сценариев, режимы 320 px / 390 px / Desktop
5	Ассеты	Готово	SVG-иконки, логотип, tokens.json; PNG/WebP по запросу
6	Руководство по стилям	Готово	Живая галерея UI Kit с правилами и контрастом WCAG
7	Handoff-спецификация	Готово	12 разделов: токены, Telegram SDK, аудио, i18n, чек-лист приёмки
—	UX-аудит (этап 1)	Экспертная часть готова	18 находок P0–P2, чек-лист из 22 пунктов для живого MVP
—	План пользовательской проверки (этап 5)	Готово	Скринер, 8 задач, SEQ/SUS, протокол, расписание

Пакет открывается по ссылке claude.ai/artifact/KjM84mjs4WktWxN4Tu8CrZ (доступ выдаётся заказчику по запросу); исходники в репозитории github.com/adilmaidanov94/asiqpai-design (публичный; онлайн-версия пакета и прототипа на adilmaidanov94.github.io/asiqpai-design).

Календарный план

Срок по ТЗ сохраняется: 2 календарных месяца (8 недель) от даты старта, шесть этапов с поэтапной приёмкой. Этапы 3 и 4 идут внахлёст, как заложено в ТЗ (0.5 + 0.75 мес. внутри первых шести недель).

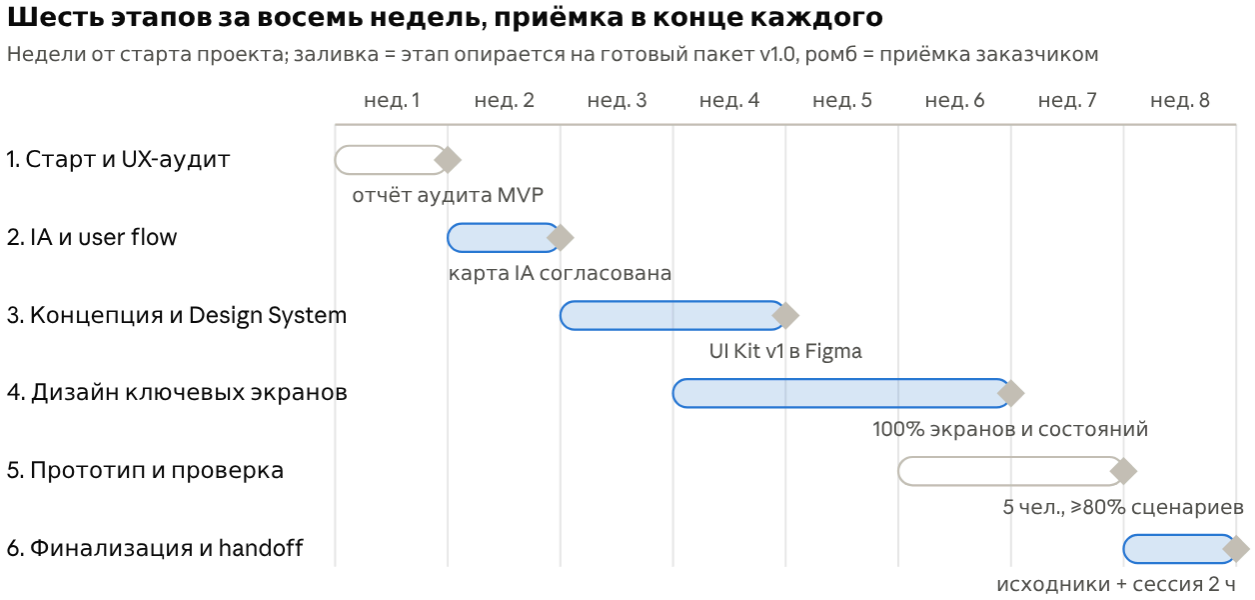

календарный план · 6 этапов, 8 недель

Этапы 2, 3, 4 и 6 опираются на готовый пакет v1.0, поэтому их время уходит на согласование и перенос в Figma, а не на разработку с нуля; этапы 1 и 5 требуют доступа к MVP и участников теста.

Этап	Недели	Содержание работ	Результат	Критерий приёмки
1. Старт и UX-аудит	1	Интервью с заказчиком, аудит живого MVP по чек-листу из 22 пунктов, верификация 18 находок v1.0, фиксация приоритетов и ограничений	Отчёт UX-аудита, перечень экранов и сценариев	Перечень согласован; нет незафиксированных критичных требований

Этап	Недели	Содержание работ	Результат	Критерий приёмки
2. IA и user flow	2	Корректировка карты разделов и 7 сценариев по итогам аудита, согласование навигационной модели	Карта IA и user flow v1.1	Все сценарии связаны, нет тупиков, структура утверждена
3. Концепция и Design System	3–4	Утверждение палитры и типографики, импорт токенов и компонентов в Figma заказчика (Tokens Studio, html.to.design), варианты компонентов	Visual concept, UI Kit v1 в Figma	Концепция согласована; базовые компоненты как переиспользуемые варианты
4. Дизайн ключевых экранов	4–6	Перенос 36 экранов в Figma, доработка по аудиту, состояния loading / empty / error / success / disabled / confirm	Полный набор макетов	100% согласованных экранов; состояния предусмотрены
5. Прототип и проверка	6–7	Обновление прототипа, рекрут 6 участников, 5 модерируемых сессий по протоколу, триаж P0–P2, правки, ре-тест	Прототип v1.1, отчёт тестирования	≥80% ключевых сценариев без критической помощи; P0 устранены
6. Финализация и handoff	8	Финальный UI Kit, ассеты SVG/PNG/WebP, обновлённая handoff-спецификация, передача Figma-исходников, сессия до 2 ч	Figma source, UI Kit, ассеты, спецификация	Исходники у заказчика; компоненты именованы; замечания закрыты

Оплата и что нужно от заказчика

Оплата поэтапная после акта приёмки каждого этапа (п. 4.5.1 ТЗ); аванс не требуется, так как большая часть работы уже предъявлена. Доли пропорциональны трудоёмкости этапов в ТЗ.

Этап	Доля от стоимости	Основание для оплаты
1. Старт и UX-аудит	10%	Акт по отчёту аудита
2. IA и user flow	10%	Акт по карте IA
3. Концепция и Design System	20%	Акт по UI Kit v1 в Figma
4. Дизайн ключевых экранов	30%	Акт по набору макетов
5. Прототип и проверка	20%	Акт по отчёту тестирования
6. Финализация и handoff	10%	Финальный акт, передача исходников

Итоговая стоимость: [сумма] ₸ (на странице задачи сумма не указана, фиксируется договором). Гарантийный период на исправление несоответствий ТЗ: 30 календарных дней после финальной приёмки (п. 6.2 ТЗ).

Для старта нужно от заказчика (п. 5.1 ТЗ):

- [ ] Доступ к актуальному MVP (тестовый аккаунт с кредитами) к неделе 1
- [ ] Бренд-материалы и решение по палитре (база: тёмная + золото) к неделе 2
- [ ] Рабочее пространство Figma с правами редактора к неделе 3
- [ ] Контакт разработчика MVP для вопросов по стеку и ограничениям
- [ ] 5–6 пользователей из базы ASIQPAI для теста к неделе 6 (или согласие на внешний рекрут)
- [ ] Обратная связь по каждому этапу в течение 3 рабочих дней после сдачи

Квалификация и приложения

Заполняется по форме листа «Квалификационные требования» ТЗ; пороги ТЗ указаны для сверки.

Поле ТЗ	Требование ТЗ	Ответ
Должность, роль	UX/UI / Product Designer, ведущий	[ФИО], ведущий UX/UI-дизайнер проекта
Образование	Желательно профильное; допускается портфолио	[вуз, специальность, год]
Общий / профильный стаж	от 2 лет / от 2 лет в мобильных или web	[лет] / [лет]
Аналогичные проекты	не менее 2; желательно music-tech, AI, Telegram Mini Apps	1) ASIQPAI дизайн-пакет v1.0, 2026, ведущий дизайнер (приложено); 2) [проект, заказчик, год, роль]; 3) [проект, заказчик, год, роль]
Сертификаты	не обязательны	[при наличии]
Занятость	не менее 50%	50% на 8 недель, на неделях 4–7 до 80%
Основание	штат / ГПХ / ИП / ТОО	[ИП / ТОО / ГПХ]
Количество людей	не менее 1	1 ведущий дизайнер; на этапе 5 привлекается UX-исследователь-модератор
Материально-техническая база	Figma, прототипирование, iOS/Android, Telegram	Figma Professional, iPhone и Android для проверки в Telegram, Telegram Desktop
Лицензионная чистота	п. 3.1.4, 3.1.10, 6.1.1	Шрифты Unbounded, Onest, JetBrains Mono по SIL OFL; иконки собственные; демо-данные вымышленные

Приложения к заявке:

1. Пакет v1.0: claude.ai/artifact/KjM84mjs4WktWxN4Tu8CrZ; исходники: github.com/adilmaidanov94/asiqpai-design.
2. Прототип онлайн, открывается на телефоне без установки: adilmaidanov94.github.io/asiqpai-design/design/prototype.html; весь пакет: adilmaidanov94.github.io/asiqpai-design.
3. Портфолио: [Figma / Behance / сайт] с 2–3 кейсами.

4. Календарный план и порядок оплаты (разделы выше).

- [ ] Заполнить поля в квадратных скобках и сумму в разделе оплаты до 22.10.2026
